

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Datum(s) van controle: 29/06/2021 **Uitgiftedatum verslag:** 29/06/2021
Verslagnummer: 0260-210629-01

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 09 252 45 45 E: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 U/ref.: 4107722623
 De agent-bezoeker: nummer 0260

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: VEOLIA
 Adres: FERNAND DEMETSKAAI 52, 1070 BRUSSEL
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: GEMEENTE AALTER
 Adres: EUROPALAAN 22, 9880 AALTER
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:
 Adres: ,
 BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: BKO OSCAR PLUIS
 Adres: ROZESTRAAT 8, 9910 KNESSELARE
 EAN- code: 541448812000200519
 Nummer teller: 1SAG3100157362
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: KINDEROPVANG

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingspen

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A


Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 18 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Beschrijving stroomkringen borden zie bijlage

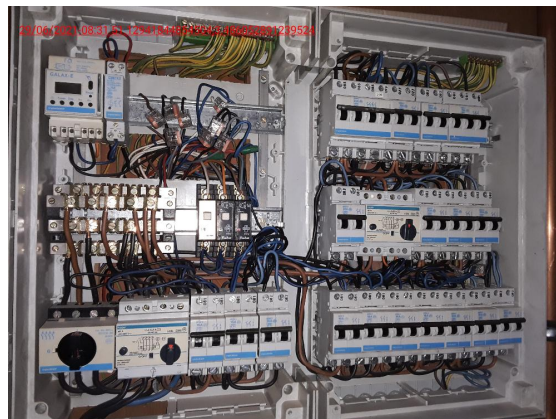

Document met uitwendige invloeden: Zie inbreuken

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 29 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 30 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

- 1 Het stroombaanschema / principeschema ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1).
- 2 Een ondertekend document met uitwendige invloeden ontbreekt (Boek 1: 9.1.6).
- 3 Het aardverbindingssysteem is niet op elk bord vermeld in een niet-huishoudelijke installatie (Boek 1: 3.1.3.3).
- 4 De te verwachten maximale kortsluitstroom ter hoogte van het bord is niet op elk bord vermeld in een niet-huishoudelijke installatie (Boek 1: 3.1.3.3).

Opmerkingen:

- 1 Het is mogelijk dat na het voorleggen van de schema's en/of beschrijving van de kringen er bij een volgende keuring bijkomende inbreuken kunnen opgemerkt worden.

Besluit van de controle:



3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1, van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0260 i.o. van de technisch directeur
 29/06/21 10:31

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

