

## DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

**Datum(s) van controle:** 08/06/2021 **Uitgiftedatum verslag:** 08/06/2021  
**Verslagnummer:** 0260-210608-01

**Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:**

Naam: Technisch Bureau Verbruggen  
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel  
 T: 09 252 45 45 E: [btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be) Ondernemingsnummer: 0406.486.616  
 U/ref.: 4107722623  
 De agent-bezoeker: nummer 0260

**Identificatie van derden:**

Opdrachtgever: VEOLIA  
 Adres: FERNAND DEMETSKAAI 52, 1070 BRUSSEL  
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: GEMEENTE AALTER  
 Adres: EUROPALAAN 22, 9880 AALTER  
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk:  
 Adres: ,  
 BTW-nummer:

**Identificatie van de elektrische installatie:**

Naam: BKO HEMELRIJK -DAGOPVANG KWAKKIE  
 Adres: KERKSTRAAT 50, 9910 KNESSELARE  
 EAN- code:  
 Nummer teller: 20096138  
 Private hoogspanningscabine: Nee  
 Type installatie: KINDEROPVANG

**Gegevens van de controle:**

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)  
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

**Informatie inhoud controle:** Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast  
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.




**Gegevens van de elektrische installatie:**

Spanning en aard van de stroom: 3 x 230V  
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 3x16 mm<sup>2</sup>  
 Type aardelektrode: Aardingspen  
 Aantal borden: 4

Nominale waarde bescherming aansluiting: 63A  
 Type algemene schakelaar: 4P 63A/300mA  
 Type aardverbindingssysteem: TT  
 Aantal stroombanen: 21+20+34+7 (reserve inbegrepen)

**BESCHRIJVING:**

Beschrijvingen borden zie bijlage stroomkringen

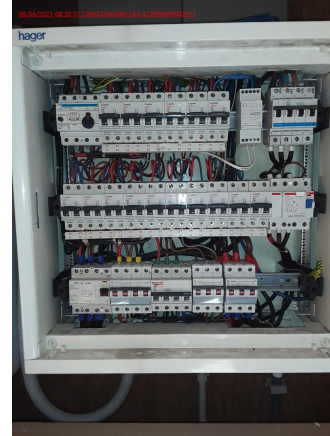

Document met uitwendige invloeden: Zie inbreuken  
 Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld  
 Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld  
 Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

**Resultaten van de controle:**

**Metingen en beproevingen:**

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 1 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 20 MOhm

**Vastgestelde inbreuken:**

- 1 Het stroombaanschema / principeschema ontbreekt (Boek 1: 3.1.2.1).
- 2 Een ondertekend document met uitwendige invloeden ontbreekt (Boek 1: 9.1.6).
- 3 Het aardverbindingssysteem is niet op elk bord vermeld in een niet-huishoudelijke installatie (Boek 1: 3.1.3.3).
- 4 De te verwachten maximale kortsluitstroom ter hoogte van het bord is niet op elk bord vermeld (Boek 1: 3.1.3.3).
- 5 De (bijkomende) differentieelstroominrichting(en) kan/kunnen overbelast worden (Boek 1: 4.4.1.1).bord BKO KN 2 DIFF.40A/30mA
- 6 De waarde van de beveiliging tegen kortsluiting is niet in overeenstemming met de stroomafwaarts geplaatste leiding (Boek 1: 4.4.1.1). BKO KN2 Kring 2b
- 7 Het gebruik van geleiders van het type VOB, zonder bijkomende afscherming is niet toegestaan (Boek 1: 5.2.9.6).Stopcontact boven bord pannenkoekenhuisje

**Opmerkingen:**

- 1 Het is mogelijk dat na het voorleggen van de schema's en/of beschrijving van de kringen er bij een volgende keuring bijkomende inbreuken kunnen opgemerkt worden.
- 2 De bovenverdieping behoort niet tot de keuring
- 3 Aarding aan bord BKO KN 2 , 5 Ohm  
 Aarding pannenkoekenhuisje 18 Ohm



**Besluit van de controle:**

- 3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1, van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.**

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

**Tijdstip van afwerking:**

agent-bezoeker 0260 i.o. van de technisch directeur  
08/06/21 10:58

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

